



# VEILIG WERKEN OP HOOGTE

# VAL NIET UIT DE LUCHT

#BastHarnas



## Checklist rolsteigers

NBN EN 1004 en 1298 Rolsteiger

### Gegevens bezoek

Datum van de controle:  Klik hier als u een datum wilt invoeren.

Naam bevoegd  
persoon:

Controle bij aannemer:

Locatie:

Reden controle:

Montage - demontage

Indienststelling

Periodieke controle/tijdens gebruik

### Foto gecontroleerde rolsteiger

### Omgeving

	Ja	Nee	NVT	Opmerkingen - foto
Voltoet de draagkracht van de ondergrond om de rolsteiger te kunnen dragen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Is de ondergrond effen gemaakt voor de aanvang van de montage?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Is de montageplaats vrij van obstakels?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wordt er bij de inplanting van de rolsteiger rekening gehouden met een veilige afstand tot de uitgravingen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wordt er bij de inplanting van de rolsteiger rekening gehouden met bovengrondse en ondergrondse leidingen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wordt de rolsteiger voldoende gesignaleerd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Is er bij inname van de openbare weg een vergunning aanwezig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

### Conformiteit rolsteigermateriaal

Reeds gecontroleerd en in orde

	Ja	Nee	NVT	Opmerkingen - foto
Voltoet de rolsteigerstructuur aan het steigerplan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Is het gebruikte rolsteigermateriaal voorzien van een geïntegreerd leuningsysteem?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Worden er bij het rolsteigersysteem bijhorende vloerelementen geleverd/geplaatst?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indien niet: zijn de vloerelementen geschikt om geplaatst te worden op het gebruikte rolsteigersysteem?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Is het steigermateriaal in goede staat (geen deuken, breuken, scheurvorming)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	




# VEILIG WERKEN OP HOOGTE

# VAL NIET UIT DE LUCHT

#BastHarnas

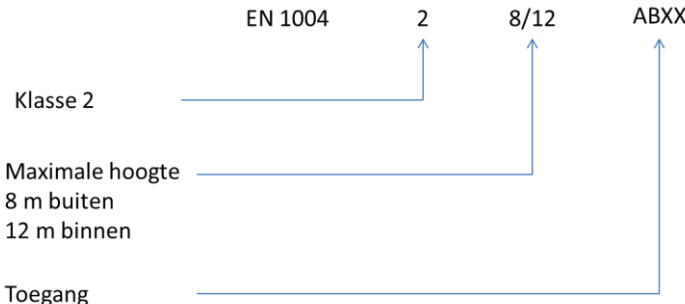

Rolsteigerdocument		Reeds gecontroleerd en in orde <input type="checkbox"/>		
	Ja	Nee	NVT	Opmerkingen – foto
Bevat het rolsteigerdocument een opbouw instructie, een schematische voorstelling en extra maatregelen voor veilige montage/demontage van de rolsteiger zonder dat de gebruikers hiervoor bijkomende risico's dienen te nemen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bevat het rolsteigerdocument een berekeningsnota of een verwijzing naar conformiteit NBN EN 1004?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Kan er een aangepast rolsteigerdocument worden voorgelegd bij een niet gestandaardiseerde opbouw?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wordt er indien men verschillende merken of typen gebruikt om een werkvloer te bouwen een nieuw rolsteigerdocument opgemaakt of verwezen naar de samenbouw instructies van de verschillende fabrikanten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Beschrijft het rolsteigerdocument de belastingklasse waarbinnen de rolsteiger mag gebruikt worden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Binnen welke klasse mag deze rolsteiger gebruikt worden volgens het rolsteigerdocument? - Klasse 1 - Klasse 2 - Klasse 3	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Bevat de rolsteiger volgende aanduiding:  <b>Voorbeeld rolsteiger</b>  <a href="#">zie het navb dossier 119 Het gebruik van ladders en steigers tijdens de afwerkingsfase (navb.constructiv.be &gt; Welzijnsinfo &gt; Publicaties)</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Opleiding/instructies		Reeds gecontroleerd en in orde <input type="checkbox"/>		
	Ja	Nee	NVT	Opmerkingen - foto
Hebben de gebruikers een opleiding gekregen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hebben de monteurs een opleiding gekregen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Is er een bevoegd persoon aangesteld en is deze voldoende opgeleid?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Is er nood aan extra opleiding voor het gebruikte rolsteigertype?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



# VEILIG WERKEN OP HOOGTE

# VAL NIET UIT DE LUCHT

#BasHarnas



Veilige montage/demontage				
	Ja	Nee	NVT	Opmerkingen – foto
Zijn de monteurs indien nodig in het bezit van bijkomende voorzieningen (harnas, leeflijn,...)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gebruiken de monteurs de bijkomende voorzieningen indien noodzakelijk (harnas, leeflijn en ankervoorzieningen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Beschikken de gebruikers over voldoende instructies om de individuele valbeveiliging correct te gebruiken?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Worden de instructies voor veilige montage/demontage gevolgd en zijn ze voldoende voor het uit te voeren werk?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Indien niet, wordt er een bijkomende last-minute risicoanalyse uitgevoerd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wordt een rolsteiger zo gemonteerd dat voor elk montageniveau zo snel mogelijk de collectieve valbeveiliging kan worden geplaatst?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Correcte opstelling en gebruik				
	Ja	Nee	NVT	Opmerkingen – foto
Wordt de rolsteiger indien nodig voorzien van regelbare spindels om de rolsteiger horizontaal te kunnen opstellen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Worden de spindels niet te ver uitgedraaid?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Worden houten verdeelplanken gebruikt om de krachten gelijkmatig te verdelen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Worden geen holle materialen of materialen met onvoldoende drukweerstand gebruikt als ondervulling (vb. holle bakstenen, isolatieplaten, ...)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wordt de rolsteiger loodrecht geplaatst?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zijn alle delen geborgd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zijn de wielen geblokkeerd tijdens gebruik?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zijn alle werkvloeren voorzien van een leuning bestaande uit een	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- bovenleuning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- tussenleuning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- plint	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Worden de klimvloeren bij voorkeur volledig dichtgelegd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zijn geschrante klimvloeren aan de buitenzijde voorzien van een leuning bestaande uit een:				
- bovenleuning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- tussenleuning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bevinden zich tijdens het verplaatsen of bij harde wind (meer dan 40 km/u) geen personen op de rolsteiger?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wordt gecontroleerd of er geen voorwerpen van de rolsteiger kunnen vallen tijdens het verplaatsen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wordt de rolsteiger nooit in de breedterichting verplaatst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



# VEILIG WERKEN OP HOOGTE

# VAL NIET UIT DE LUCHT

#BasHarnas



(altijd in de lengterichting of diagonaal)?				
Worden bij het verplaatsen van de rolsteiger de stabilisatoren zo kort mogelijk bij de grond gehouden, om kantelen te voorkomen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Worden geen hijswerktuigen opgehangen aan de rolsteiger?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sluit de plint aan op de werkvloer?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Worden geschikte vloerelementen gebruikt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Worden de werkvloeren volledig dichtgelegd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Worden de windverbanden/diagonalen geplaatst volgens de opbouw instructies?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zijn de onderdelen van de rolsteiger zo met elkaar verbonden zodat ze niet ten opzichte van elkaar kunnen bewegen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wordt het gebruik van netten en zeilen beperkt binnen de grenzen voorzien door de fabrikant?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wordt de rolsteiger bij gebruik van netten en zeilen voorzien van voldoende en aangepaste verankeringen (volgens de instructies van de fabrikant)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wordt de maximale opbouwhoogte gerespecteerd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Is het hoogteverschil tussen de grond en het eerste werkplatform maximaal 4,60 m?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Is de verticale afstand tussen de vloeren:				
- Minimaal 1,90 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Maximaal 4,20 m of	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Maximaal 2,10 m bij verspringende vloeren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wordt de rolsteiger niet via de buitenzijde beklommen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zijn er geïntegreerde ladders/trappen aanwezig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Worden de ladderluiken steeds gesloten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wordt de rolsteiger gebruikt binnen de grenzen voorzien in het rolsteigerdocument?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Beantwoorden alle rolsteigeronderdelen aan de eisen van de belastingklasse?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wordt de maximale belasting gerespecteerd (materiaal, materieel, personen, ...)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wordt afval en overtollig materiaal van de rolsteiger verwijderd?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Worden er geen leuning weggenomen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Worden rolsteigers in de buurt van elektrische leidingen of hoge rolsteigers van een aarding voorzien?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wordt de rolsteiger ontoegankelijk gemaakt voor derden/onbevoegden (onderste ladderluik gesloten)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



VEILIG WERKEN OP HOOGTE  
**VAL NIET UIT DE LUCHT**  
#BastHarnas



Worden rolsteigers nooit verlengd en met elkaar verbonden met behulp van vloeren of andere voorzieningen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Andere tekortkomingen/bemerkingen</b>				
	Ja	Nee	NVT	Opmerkingen – foto
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Rolsteigerlabel</b>				
	Ja	Nee	NVT	Opmerkingen – foto
Is er een rolsteigerlabel aanwezig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wordt de datum van deze controle op de rolsteiger weergegeven?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Volgende periodieke controle</b>				
Datum:	Handtekening bevoegd persoon belast met de controle:			
